



# REPORT EXECUÇÃO DE PROJETOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS (MG)

Nº 02

30/11/2024

*Clique no mapa ao lado e navegue por região*

*[Clique aqui](#) para acessar os projetos que abrangem toda a bacia*

*[Clique aqui](#) para acessar o sumário de projetos*

*Report produzido e alimentado pelas Gerências de Integração e Projetos da Agência Peixe Vivo*





*A seguir, você encontrará informações sobre os projetos em andamento, os que foram recentemente concluídos e uma prévia das iniciativas futuras.*

*O objetivo é apresentar um panorama claro das atividades e dos avanços que estão sendo feitos, destacando os resultados alcançados e as próximas etapas.*

## **TODA A BACIA DO VELHAS**

1. PROPOSTA DE ENQUADRAMENTO DA BACIA DO RIO DAS VELHAS E DA BACIA DOS RIOS JEQUITÁ-PACÚ
2. PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL DO CBH RIO DAS VELHAS – 5º ADITIVO
3. BIOMONITORAMENTO DE PEIXES NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS
4. GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL (PEA), CONSERVAÇÃO E PRODUÇÃO DE ÁGUA (PCPA), SANEAMENTO RURAL E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE MANANCIAS URBANOS
5. MOBILIZAÇÃO SOCIAL, CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA O CBH VELHAS NAS 23 UTES EXISTENTES NA BACIA
6. **EM BREVE NA BACIA DO RIO DAS VELHAS**

## **ALTO RIO DAS VELHAS**

1. EXECUÇÃO DE PROJETOS DO PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO E PRODUÇÃO DE ÁGUA NO ALTO VELHAS – MICROBACIA DO RIO MARACUJÁ
2. **EM BREVE NO ALTO RIO DAS VELHAS**

## **MÉDIO ALTO RIO DAS VELHAS**

1. PLANO DE MANEJO DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APA) MUNICIPAL ANDREQUICÉ E DO REFÚGIO DE VIDA SILVESTRE ESTADUAL MACAÚBAS (RVSEM)
2. PLANO DE MANEJO DO PARQUE ESTADUAL DA SERRA DO SOBRADO (PESS)
3. ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO/EXECUTIVO PARA COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE ESGOTOS DOMÉSTICOS EM MÓDULOS INDIVIDUAIS EM LOCALIDADES RURAIS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS – JABOTICATUBAS E OURO PRETO
4. **EM BREVE NO MÉDIO ALTO RIO DAS VELHAS**

## **MÉDIO BAIXO RIO DAS VELHAS**

1. EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DE SOLUÇÕES INDIVIDUAIS DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DOMÉSTICOS, CONGONHAS DO NORTE/MG
2. **EM BREVE NO MÉDIO BAIXO RIO DAS VELHAS**

## **BAIXO RIO DAS VELHAS**

1. EXECUÇÃO DE PROJETOS DO PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO E PRODUÇÃO DE ÁGUA NO BAIXO VELHAS, VÁRZEA DA PALMA/MG
2. EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DE SOLUÇÕES INDIVIDUAIS DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DOMÉSTICOS, DIAMANTINA/MG
3. **EM BREVE NO BAIXO RIO DAS VELHAS**

# TODA A BACIA DO VELHAS



## PROPOSTA DE ENQUADRAMENTO DA BACIA DO RIO DAS VELHAS E DA BACIA DOS RIOS JEQUITAÍ-PACUÍ



### LOCAL DE EXECUÇÃO

BACIA DO RIO DAS VELHAS (SF5)  
BACIA DOS RIOS JEQUITAÍ-PACUÍ (SF6)



### EMPRESA CONTRATADA

ECOPLAN ENGENHARIA LTDA



### DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)

10/08/2023



### VALOR GLOBAL DO CONTRATO

R\$ 1.701.792,02



### DURAÇÃO DO PROJETO

19 MESES



### VALOR EXECUTADO ATÉ NOVEMBRO/24

R\$ 1.011.954,36



### NÚMERO DO CONTRATO

020/2022



### PRÓXIMAS ETAPAS


Consolidação da proposta de metas e alternativas de enquadramento e programa de efetivação



FISCAL TÉCNICO APV  
JOÃO PAULO COIMBRA



### PERCENTUAL DE EXECUÇÃO



OBS: ESTA É UMA CONTRATAÇÃO DO CBHSF NA QUAL O CBH DO RIO DAS VELHAS É BENEFICIÁRIO



# TODA A BACIA DO VELHAS



## PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL DO CBH RIO DAS VELHAS – 6º ADITIVO



**LOCAL DE EXECUÇÃO**  
TODA A BACIA HIDROGRÁFICA



**EMPRESA CONTRATADA**  
TANTO COMUNICAÇÃO LTDA.



**DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)**  
12/09/2019



**VALOR GLOBAL DO CONTRATO**  
R\$ 8.230.145,00



**DURAÇÃO DO PROJETO**  
66 MESES



**VALOR EXECUTADO ATÉ NOVEMBRO/24**  
R\$ 7.650.008,96



**NÚMERO DO CONTRATO**  
010/2019




**PRÓXIMAS ETAPAS**  
Nova licitação em andamento



**FISCAL TÉCNICO APV**  
DANIEL BRITO



**PERCENTUAL DE EXECUÇÃO**



# TODA A BACIA DO VELHAS



## BIOMONITORAMENTO DE PEIXES NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS



**LOCAL DE EXECUÇÃO**  
TODA A BACIA HIDROGRÁFICA



**EMPRESA CONTRATADA**  
FUNDEP



**DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)**  
28/02/2020



**VALOR GLOBAL DO CONTRATO**  
R\$ 4.638.178,74



**DURAÇÃO DO PROJETO**  
60 MESES



**VALOR EXECUTADO ATÉ NOVEMBRO/24**  
R\$ 3.168.542,88



**NÚMERO DO CONTRATO**  
001/2020




**PRÓXIMAS ETAPAS**  
1 Entrega do Produto 10  
2 Avaliação do Produto 10  
3



**FISCAL TÉCNICO APV**  
JACQUELINE FONSECA



**PERCENTUAL DE EXECUÇÃO**



# TODA A BACIA DO VELHAS



## GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL (PEA), CONSERVAÇÃO E PRODUÇÃO DE ÁGUA (PCPA), SANEAMENTO RURAL E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE MANANCIAIS URBANOS



**LOCAL DE EXECUÇÃO**  
TODA A BACIA HIDROGRÁFICA



**EMPRESA CONTRATADA**  
ÁGUA E SOLO ESTUDOS E PROJETOS LTDA.



**DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)**  
24/04/2024



**VALOR GLOBAL DO CONTRATO**  
R\$ 1.315.258,54



**DURAÇÃO DO PROJETO**  
12 MESES



**VALOR EXECUTADO ATÉ NOVEMBRO/24**  
R\$ 503.086,41



**NÚMERO DO CONTRATO**  
011/2024



### PRÓXIMAS ETAPAS


Elaboração de termos de referência e do Manual Operativo do Programa de Nascentes e Mananciais Urbanos, fiscalização das obras do PCPA Alto Velhas e do PCPA Baixo Velhas



**FISCAL TÉCNICO APV**  
GUILHERME SILVA



**PERCENTUAL DE EXECUÇÃO**



# TODA A BACIA DO VELHAS



## MOBILIZAÇÃO SOCIAL, CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA O CBH VELHAS NAS 23 UTES EXISTENTES NA BACIA



**LOCAL DE EXECUÇÃO**  
TODA A BACIA HIDROGRÁFICA



**EMPRESA CONTRATADA**  
TANTO DESIGN LTDA



**DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)**  
15/02/2023



**VALOR GLOBAL DO CONTRATO**  
R\$ 3.150.351,85



**DURAÇÃO DO PROJETO**  
24 MESES



**VALOR EXECUTADO ATÉ NOVEMBRO/24**  
R\$ 2.535.229,69



**NÚMERO DO CONTRATO**  
004/2023




**PRÓXIMAS ETAPAS**  
Avaliação do produto 22



**FISCAL TÉCNICO APV**  
DIMAS SILVA



**PERCENTUAL DE EXECUÇÃO**







EM BREVE

## EM TODA A BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS

1. SEM NOVOS PROJETOS PREVISTOS

# ALTO RIO DAS VELHAS



## EXECUÇÃO DE PROJETOS DO PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO E PRODUÇÃO DE ÁGUA NO ALTO VELHAS - MICROBACIA DO RIO MARACUJÁ



**LOCAL DE EXECUÇÃO**  
OURO PRETO (MG)  
MICROBACIA DO RIO MARACUJÁ  
UTE NASCENTES



**EMPRESA CONTRATADA**  
FORTAL ENGENHARIA LTDA.



**DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)**  
31/07/2024



**VALOR GLOBAL DO CONTRATO**  
R\$ 4.766.653,00



**DURAÇÃO DO PROJETO**  
26 MESES



**VALOR EXECUTADO ATÉ NOVEMBRO/24**  
R\$ 903.042,42



**NÚMERO DO CONTRATO**  
024/2024




**PRÓXIMAS ETAPAS**  
1º boletim de medição emitido  
2º boletim de medição



**FISCAL TÉCNICO APV**  
GUILHERME GUERRA




**PERCENTUAL DE EXECUÇÃO**



## NO ALTO RIO DAS VELHAS

1. ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA MELHORIA DE DRENAGEM SUPERFICIAL NA COMUNIDADE QUILOMBOLA MANGUEIRAS, NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG – UTE RIBEIRÃO DO ONÇA

# MÉDIO ALTO RIO DAS VELHAS



## PLANO DE MANEJO DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APA) MUNICIPAL ANDREQUICÉ E DO REFÚGIO DE VIDA SILVESTRE ESTADUAL MACAÚBAS (RVSEM)



### LOCAL DE EXECUÇÃO

SANTA LUZIA /MG E LAGOA SANTA/MG  
UTE PODEROSO VERMELHO,  
UTE CARSTE, UTE RIO TAQUARAÇU



### DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)

01/11/2023



### DURAÇÃO DO PROJETO

15 MESES



### NÚMERO DO CONTRATO

043/2023



FISCAL TÉCNICO APV  
JOÃO PAULO COIMBRA



### EMPRESA CONTRATADA

DETZEL CONSULTORES ASSOCIADOS S/S



### VALOR GLOBAL DO CONTRATO

R\$ 593.813,64



### VALOR EXECUTADO ATÉ NOVEMBRO/24


R\$ 498.803,45




### PRÓXIMAS ETAPAS

1 Entregue para PM Santa Luzia e IEF  
2 Reunião CPB/COPAM no dia 26/11/2024  
3 Entrega final do atlas e bancos de dados

### PERCENTUAL DE EXECUÇÃO



# MÉDIO ALTO RIO DAS VELHAS



## PLANO DE MANEJO DO PARQUE ESTADUAL DA SERRA DO SOBRADO (PESS)



**LOCAL DE EXECUÇÃO**  
SÃO JOSÉ DA LAPA/MG  
UTE RIBEIRÃO DA MATA



**EMPRESA CONTRATADA**  
DETZEL CONSULTORES ASSOCIADOS S/S



**DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)**  
01/11/2023



**VALOR GLOBAL DO CONTRATO**  
R\$ 419.736,92



**DURAÇÃO DO PROJETO**  
15 MESES



**VALOR EXECUTADO ATÉ NOVEMBRO/24**  
R\$ 356.776,38



**NÚMERO DO CONTRATO**  
048/2023




**PRÓXIMAS ETAPAS**  
Entregue para PM Santa Luzia e IEF  
Reunião do Conselho Consultivo  
Entrega final do atlas e bancos de dados



**FISCAL TÉCNICO APV**  
JOÃO PAULO COIMBRA



**PERCENTUAL DE EXECUÇÃO**



# MÉDIO ALTO RIO DAS VELHAS



## ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO/EXECUTIVO PARA COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE ESGOTOS DOMÉSTICOS EM MÓDULOS INDIVIDUAIS EM LOCALIDADES RURAIS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS



### LOCAL DE EXECUÇÃO

OURO PRETO (MG) – MACIEL  
UTE NASCENTES  
JABOTICATUBAS (MG) – SÃO JOSÉ DA SERRA  
UTE JABÓ/BALDIM



### DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)

18/03/2024



### DURAÇÃO DO PROJETO

07 MESES



### NÚMERO DO CONTRATO

008/2024



FISCAL TÉCNICO APV  
GUILHERME SILVA



### EMPRESA CONTRATADA

CENTRO DE REFERÊNCIA EM ESTAÇÕES  
SUSTENTÁVEIS DE TRATAMENTO DE ESGOTO



### VALOR GLOBAL DO CONTRATO

R\$ 326.700,00



### VALOR EXECUTADO ATÉ NOVEMBRO/24


R\$ 32.670,00



### PRÓXIMAS ETAPAS

1 Revisão do Produto 2  
2 Revisão do Produto 3

PERCENTUAL  
DE EXECUÇÃO





## NO MÉDIO ALTO RIO DAS VELHAS

1. ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO/EXECUTIVO PARA COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE ESGOTOS DOMÉSTICOS EM MÓDULOS INDIVIDUAIS EM LOCALIDADES RURAIS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS
  - COMUNIDADE TRONQUEIRAS (FUNILÂNDIA/MG) – UTE RIBEIRÃO JEQUITIBÁ, UTE CARSTE (MÉDIO ALTO VELHAS)
  - COMUNIDADE DOUTOR CAMPOLINA (JEQUITIBÁ/MG) – UTE RIBEIRÃO JEQUITIBÁ (MÉDIO ALTO VELHAS)
  - COMUNIDADE JOÃO DA COSTA (BALDIM/MG) – UTE JABÓ/BALDIM (MÉDIO ALTO VELHAS)
2. ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO COLETIVO PARA O MUNICÍPIO DE JABOTICATUBAS/MG – UTE JABÓ/BALDIM
3. ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO COLETIVO PARA O MUNICÍPIO DE JEQUITIBÁ/MG – UTE RIBEIRÃO JEQUITIBÁ
4. ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO COLETIVO PARA O MUNICÍPIO DE ESMERALDAS/MG – UTE RIBEIRÃO DA MATA
5. EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE PROPRIEDADES RURAIS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIBEIRÃO BONITO, EM CAETÉ (MG)

# MÉDIO BAIXO RIO DAS VELHAS



## EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DE SOLUÇÕES INDIVIDUAIS DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DOMÉSTICOS, CONGONHAS DO NORTE/MG



**LOCAL DE EXECUÇÃO**  
CONGONHAS DO NORTE (MG)  
COMUNIDADE LAGOA  
UTE RIO CIPÓ, UTE RIO PARAÚNA



**EMPRESA CONTRATADA**  
APLICAR ENGENHARIA LTDA.



**DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)**  
13/09/2024



**VALOR GLOBAL DO CONTRATO**  
R\$ 839.000,00



**DURAÇÃO DO PROJETO**  
06 MESES



**VALOR EXECUTADO ATÉ NOVEMBRO/24**  
R\$ 82.338,00



**NÚMERO DO CONTRATO**  
052/2024



**PRÓXIMAS ETAPAS**  
Execução de obras de soluções individuais de esgotamento sanitário



**FISCAL TÉCNICO APV**  
FLÁVIA MENDES



**PERCENTUAL DE EXECUÇÃO**






## NO MÉDIO BAIXO RIO DAS VELHAS

1. ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO COLETIVO PARA O MUNICÍPIO DE INIMUTABA/MG – UTE SANTO ANTÔNIO/MAQUINÉ

# BAIXO RIO DAS VELHAS



## EXECUÇÃO DE PROJETOS DO PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO E PRODUÇÃO DE ÁGUA NO BAIXO VELHAS, VÁRZEA DA PALMA/MG



**LOCAL DE EXECUÇÃO**  
VÁRZEA DA PALMA (MG)  
MICROBACIA CÓRREGO PEDRAS GRANDES  
UTE GUAICÚ



**EMPRESA CONTRATADA**  
FORTAL ENGENHARIA LTDA.



**DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)**  
23/07/2024



**VALOR GLOBAL DO CONTRATO**  
R\$ 3.336.000,00



**DURAÇÃO DO PROJETO**  
12 MESES



**VALOR EXECUTADO ATÉ NOVEMBRO/24**  
R\$ 149.527,27



**NÚMERO DO CONTRATO**  
036/2024




**PRÓXIMAS ETAPAS**  
2º boletim de medição emitido  
3º boletim de medição




**FISCAL TÉCNICO APV**  
GUILHERME SILVA



**PERCENTUAL DE EXECUÇÃO**



# BAIXO RIO DAS VELHAS



## EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DE SOLUÇÕES INDIVIDUAIS DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DOMÉSTICOS, DIAMANTINA/MG



**LOCAL DE EXECUÇÃO**  
DIAMANTINA (MG)  
COMUNIDADE BATATAL  
UTE RIO PARDO



**EMPRESA CONTRATADA**  
APLICAR ENGENHARIA LTDA.



**DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)**  
13/09/2024



**VALOR GLOBAL DO CONTRATO**  
R\$ 2.087.619,80



**DURAÇÃO DO PROJETO**  
08 MESES



**VALOR EXECUTADO ATÉ NOVEMBRO/24**  
R\$ 75.949,47



**NÚMERO DO CONTRATO**  
051/2024





**PRÓXIMAS ETAPAS**  
Execução de obras de soluções individuais de esgotamento sanitário



**FISCAL TÉCNICO APV**  
FLÁVIA MENDES



**PERCENTUAL DE EXECUÇÃO**

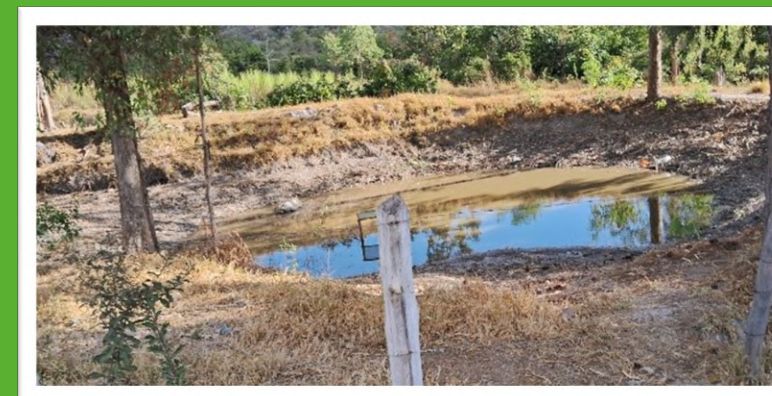



## NO BAIXO RIO DAS VELHAS

### 1. ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO/EXECUTIVO PARA COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE ESGOTOS DOMÉSTICOS EM MÓDULOS INDIVIDUAIS EM LOCALIDADES RURAIS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS

- COMUNIDADE RIACHINHO (MORRO DA GARÇA/MG) – UTE RIO BICUDO (BAIXO VELHAS)

# EXPEDIENTE

## CBH DO RIO DAS VELHAS

Poliana Aparecida Valgas de Carvalho  
**Presidenta**

Ronald de Carvalho Guerra  
**Vice-presidente**

Renato Junio Constâncio  
**Secretário**

Heloisa Cristina França Cavaliéri  
**Secretário Adjunto**

## AGÊNCIA PEIXE VIVO

Gustavo Henrique Costa Simões  
**Presidente do Conselho de Administração**

Rúbia Santos Barbosa Mansur  
**Diretora Geral Interina**

Berenice Coutinho Malheiros dos Santos  
**Gerente de Administração e Finanças**

Jacqueline Evangelista Fonseca  
**Gerente de Projetos Interina**

Ohany Vasconcelos Ferreira  
**Gerente de Integração Interina**

André Amaral Horta  
**Gerente de Gestão Estratégica**

Daniel Alexandre de Brito  
**Analista de comunicação**  
*Produção, projeto gráfico e revisão final*

João Paulo Paulino Coimbra  
**Coordenador Técnico**  
*Produção e revisão final*



## COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS

Rua Dos Carijós, 244 – Sala 622 – Centro,  
Belo Horizonte (MG) - CEP 30.120-060  
[www.cbhvelhas.org.br](http://www.cbhvelhas.org.br) | @cbhriodasvelhas

## AGÊNCIA PEIXE VIVO

Rua dos Carijós, 166 – 5º andar – Centro,  
Belo Horizonte (MG) - CEP 30.120-060  
[www.agenciapeixevivo.org.br](http://www.agenciapeixevivo.org.br) | @agenciapeixevivo



**COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS**

Rua Dos Carijós, 244 – Sala 622 – Centro,  
Belo Horizonte (MG) - CEP 30.120-060

[www.cbhvelhas.org.br](http://www.cbhvelhas.org.br) | [@cbhriodasvelhas](https://www.instagram.com/cbhriodasvelhas)

**AGÊNCIA PEIXE VIVO**

Rua dos Carijós, 166 – 5º andar – Centro,  
Belo Horizonte (MG) - CEP 30.120-060

[www.agenciapeixe vivo.org.br](http://www.agenciapeixe vivo.org.br) | [@agenciapeixe vivo](https://www.instagram.com/agenciapeixe vivo)
