



REPORT EXECUÇÃO DE PROJETOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS (MG)

Nº 03

30/01/2025

Clique no mapa ao lado e navegue por região

[Clique aqui](#) para acessar os projetos que abrangem toda a bacia

[Clique aqui](#) para acessar o sumário de projetos

Report produzido e alimentado pelas Gerências de Integração e Projetos da Agência Peixe Vivo





A seguir, você encontrará informações sobre os projetos em andamento, os que foram recentemente concluídos e uma prévia das iniciativas futuras.

O objetivo é apresentar um panorama claro das atividades e dos avanços que estão sendo feitos, destacando os resultados alcançados e as próximas etapas.

TODA A BACIA DO VELHAS

1. PROPOSTA DE ENQUADRAMENTO DA BACIA DO RIO DAS VELHAS E DA BACIA DOS RIOS JEQUITÁ-PACÚ
2. PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL DO CBH RIO DAS VELHAS – 5º ADITIVO
3. BIOMONITORAMENTO DE PEIXES NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS
4. GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL (PEA), CONSERVAÇÃO E PRODUÇÃO DE ÁGUA (PCPA), SANEAMENTO RURAL E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE MANANCIAS URBANOS
5. MOBILIZAÇÃO SOCIAL, CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA O CBH VELHAS NAS 23 UTES EXISTENTES NA BACIA
6. **EM BREVE NA BACIA DO RIO DAS VELHAS**

ALTO RIO DAS VELHAS

1. EXECUÇÃO DE PROJETOS DO PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO E PRODUÇÃO DE ÁGUA NO ALTO VELHAS – MICROBACIA DO RIO MARACUJÁ
2. **EM BREVE NO ALTO RIO DAS VELHAS**

MÉDIO ALTO RIO DAS VELHAS

1. PLANO DE MANEJO DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APA) MUNICIPAL ANDREQUICÉ E DO REFÚGIO DE VIDA SILVESTRE ESTADUAL MACAÚBAS (RVSEM)
2. PLANO DE MANEJO DO PARQUE ESTADUAL DA SERRA DO SOBRADO (PESS)
3. ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO/EXECUTIVO PARA COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE ESGOTOS DOMÉSTICOS EM MÓDULOS INDIVIDUAIS EM LOCALIDADES RURAIS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS – JABOTICATUBAS E OURO PRETO (LOTE 1)
4. ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO/EXECUTIVO PARA COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE ESGOTOS DOMÉSTICOS EM MÓDULOS INDIVIDUAIS EM LOCALIDADES RURAIS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS – JABOTICATUBAS E OURO PRETO (LOTE 2)
5. **EM BREVE NO MÉDIO ALTO RIO DAS VELHAS**

MÉDIO BAIXO RIO DAS VELHAS

1. EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DE SOLUÇÕES INDIVIDUAIS DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DOMÉSTICOS, CONGONHAS DO NORTE/MG
2. **EM BREVE NO MÉDIO BAIXO RIO DAS VELHAS**

BAIXO RIO DAS VELHAS

1. EXECUÇÃO DE PROJETOS DO PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO E PRODUÇÃO DE ÁGUA NO BAIXO VELHAS, VÁRZEA DA PALMA/MG
2. EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DE SOLUÇÕES INDIVIDUAIS DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DOMÉSTICOS, DIAMANTINA/MG
3. ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO/EXECUTIVO PARA COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE ESGOTOS DOMÉSTICOS EM MÓDULOS INDIVIDUAIS EM LOCALIDADES RURAIS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS – JABOTICATUBAS E OURO PRETO (LOTE 2)
4. **EM BREVE NO BAIXO RIO DAS VELHAS**

TODA A BACIA DO VELHAS



PROPOSTA DE ENQUADRAMENTO DA BACIA DO RIO DAS VELHAS E DA BACIA DOS RIOS JEQUITAÍ-PACUÍ



LOCAL DE EXECUÇÃO

BACIA DO RIO DAS VELHAS (SF5)
BACIA DOS RIOS JEQUITAÍ-PACUÍ (SF6)



EMPRESA CONTRATADA

ECOPLAN ENGENHARIA LTDA



DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)

10/08/2023



VALOR GLOBAL DO CONTRATO

R\$ 1.701.792,02



DURAÇÃO DO PROJETO

19 MESES



VALOR EXECUTADO ATÉ JANEIRO/25

R\$ 1.011.954,36



NÚMERO DO CONTRATO

020/2022



PRÓXIMAS ETAPAS

Consolidação da proposta de metas e alternativas de enquadramento e programa de efetivação



FISCAL TÉCNICO APV
JOÃO PAULO COIMBRA



PERCENTUAL DE EXECUÇÃO



OBS: ESTA É UMA CONTRATAÇÃO DO CBHSF NA QUAL O CBH DO RIO DAS VELHAS É BENEFICIÁRIO



TODA A BACIA DO VELHAS



PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL DO CBH RIO DAS VELHAS – 6º ADITIVO



LOCAL DE EXECUÇÃO
TODA A BACIA HIDROGRÁFICA



EMPRESA CONTRATADA
TANTO COMUNICAÇÃO LTDA



DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)
12/09/2019



VALOR GLOBAL DO CONTRATO
R\$ 8.230.145,00



DURAÇÃO DO PROJETO
66 MESES



VALOR EXECUTADO ATÉ JANEIRO/25
R\$ 7.742.838,13



NÚMERO DO CONTRATO
010/2019




PRÓXIMAS ETAPAS
1 Continuidade das ações de comunicação
2
3 Nova licitação em andamento



FISCAL TÉCNICO APV
DANIEL BRITO



PERCENTUAL DE EXECUÇÃO



TODA A BACIA DO VELHAS



BIOMONITORAMENTO DE PEIXES NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS



LOCAL DE EXECUÇÃO
TODA A BACIA HIDROGRÁFICA



EMPRESA CONTRATADA
FUNDEP



DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)
28/02/2020



VALOR GLOBAL DO CONTRATO
R\$ 4.638.178,74



DURAÇÃO DO PROJETO
60 MESES



VALOR EXECUTADO ATÉ JANEIRO/25
R\$ 3.168.542,88



NÚMERO DO CONTRATO
001/2020




PRÓXIMAS ETAPAS
1 Entrega do Produto 10
2 Avaliação do Produto 10
3



FISCAL TÉCNICO APV
JACQUELINE FONSECA



**PERCENTUAL
DE EXECUÇÃO**



TODA A BACIA DO VELHAS



GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL (PEA), CONSERVAÇÃO E PRODUÇÃO DE ÁGUA (PCPA), SANEAMENTO RURAL E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE MANANCIAIS URBANOS



LOCAL DE EXECUÇÃO
TODA A BACIA HIDROGRÁFICA



EMPRESA CONTRATADA
ÁGUA E SOLO ESTUDOS E PROJETOS LTDA.



DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)
24/04/2024



VALOR GLOBAL DO CONTRATO
R\$ 1.315.258,54



DURAÇÃO DO PROJETO
12 MESES



VALOR EXECUTADO ATÉ JANEIRO/25
R\$ 628.035,98



NÚMERO DO CONTRATO
011/2024



PRÓXIMAS ETAPAS
Elaboração de termos de referência, produção de pareceres técnicos e fiscalização das obras do Programa de Conservação e Produção de Água e do Programa de Saneamento Rural



FISCAL TÉCNICO APV
GUILHERME SILVA



PERCENTUAL DE EXECUÇÃO



TODA A BACIA DO VELHAS



MOBILIZAÇÃO SOCIAL, CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA O CBH VELHAS NAS 23 UTES EXISTENTES NA BACIA



LOCAL DE EXECUÇÃO
TODA A BACIA HIDROGRÁFICA



EMPRESA CONTRATADA
TANTO DESIGN LTDA



DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)
15/02/2023



VALOR GLOBAL DO CONTRATO
R\$ 3.150.351,85



DURAÇÃO DO PROJETO
24 MESES



VALOR EXECUTADO ATÉ JANEIRO/25
R\$ 3.060.879,97



NÚMERO DO CONTRATO
004/2023




PRÓXIMAS ETAPAS
Avaliação do Produto 24



FISCAL TÉCNICO APV
DIMAS SILVA



PERCENTUAL DE EXECUÇÃO





EM BREVE

EM TODA A BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS

1. SEM NOVOS PROJETOS PREVISTOS

ALTO RIO DAS VELHAS



EXECUÇÃO DE PROJETOS DO PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO E PRODUÇÃO DE ÁGUA NO ALTO VELHAS - MICROBACIA DO RIO MARACUJÁ



LOCAL DE EXECUÇÃO
OURO PRETO (MG)
MICROBACIA DO RIO MARACUJÁ
UTE NASCENTES



EMPRESA CONTRATADA
FORTAL ENGENHARIA LTDA.



DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)
31/07/2024



VALOR GLOBAL DO CONTRATO
R\$ 4.766.653,00



DURAÇÃO DO PROJETO
26 MESES



VALOR EXECUTADO ATÉ JANEIRO/25
R\$ 1.493.544,54



NÚMERO DO CONTRATO
024/2024



PRÓXIMAS ETAPAS
6º boletim de medição



FISCAL TÉCNICO APV
GUILHERME GUERRA



PERCENTUAL DE EXECUÇÃO



NO ALTO RIO DAS VELHAS

- 1. ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA MELHORIA DE DRENAGEM SUPERFICIAL NA COMUNIDADE QUILOMBOLA MANGUEIRAS, NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG – UTE RIBEIRÃO DO ONÇA**

MÉDIO ALTO RIO DAS VELHAS



PLANO DE MANEJO DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APA) MUNICIPAL ANDREQUICÉ E DO REFÚGIO DE VIDA SILVESTRE ESTADUAL MACAÚBAS (RVSEM)



LOCAL DE EXECUÇÃO

SANTA LUZIA /MG E LAGOA SANTA/MG
UTE PODEROSO VERMELHO,
UTE CARSTE, UTE RIO TAQUARAÇU



DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)

01/11/2023



DURAÇÃO DO PROJETO

15 MESES



NÚMERO DO CONTRATO

043/2023



FISCAL TÉCNICO APV
JOÃO PAULO COIMBRA



EMPRESA CONTRATADA

DETZEL CONSULTORES ASSOCIADOS S/S



VALOR GLOBAL DO CONTRATO

R\$ 593.813,64



VALOR EXECUTADO ATÉ JANEIRO/25


R\$ 498.803,45



PRÓXIMAS ETAPAS

1 Entregue para PM Santa Luzia e IEF
2 Reunião CPB/COPAM no dia 26/11/2024
3 Análise do atlas e bancos de dados

PERCENTUAL DE EXECUÇÃO



MÉDIO ALTO RIO DAS VELHAS



PLANO DE MANEJO DO PARQUE ESTADUAL DA SERRA DO SOBRADO (PESS)



LOCAL DE EXECUÇÃO
SÃO JOSÉ DA LAPA/MG
UTE RIBEIRÃO DA MATA



EMPRESA CONTRATADA
DETZEL CONSULTORES ASSOCIADOS S/S



DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)
01/11/2023



VALOR GLOBAL DO CONTRATO
R\$ 419.736,92



DURAÇÃO DO PROJETO
15 MESES



VALOR EXECUTADO ATÉ JANEIRO/25
R\$ 356.776,38



NÚMERO DO CONTRATO
048/2023




PRÓXIMAS ETAPAS
1 Entregue para IEF
2 Reunião CPB/COPAM no dia 28/01/2025
3 Análise do atlas e bancos de dados



FISCAL TÉCNICO APV
JOÃO PAULO COIMBRA



PERCENTUAL DE EXECUÇÃO



MÉDIO ALTO RIO DAS VELHAS



ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO/EXECUTIVO PARA COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE ESGOTOS DOMÉSTICOS EM MÓDULOS INDIVIDUAIS EM LOCALIDADES RURAIS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS (LOTE 1)



LOCAL DE EXECUÇÃO

OURO PRETO (MG) – MACIEL
UTE NASCENTES
JABOTICATUBAS (MG) – SÃO JOSÉ DA SERRA
UTE JABÓ/BALDIM



DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)

18/03/2024



DURAÇÃO DO PROJETO

10 MESES



NÚMERO DO CONTRATO

008/2024



FISCAL TÉCNICO APV
GUILHERME SILVA



EMPRESA CONTRATADA

CENTRO DE REFERÊNCIA EM ESTAÇÕES
SUSTENTÁVEIS DE TRATAMENTO DE ESGOTO



VALOR GLOBAL DO CONTRATO

R\$ 326.700,00



VALOR EXECUTADO ATÉ JANEIRO/25

R\$ 179.685,00



PRÓXIMAS ETAPAS

Revisão do Produto 3

PERCENTUAL
DE EXECUÇÃO



MÉDIO ALTO RIO DAS VELHAS



ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO/EXECUTIVO PARA COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE ESGOTOS DOMÉSTICOS EM MÓDULOS INDIVIDUAIS EM LOCALIDADES RURAIS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS (LOTE 2)



LOCAL DE EXECUÇÃO

FUNILÂNDIA (MG) – TRONQUEIRAS (UTE RIBEIRÃO JEQUITIBÁ)
JEQUITIBÁ (MG) – DOUTOR CAMPOLINA (UTE RIBEIRÃO JEQUITIBÁ)
MORRO DA GARÇA (MG) – RIACHINHO (UTE RIO BICUDO)
BALDIM (MG) – JOÃO DA COSTA (UTE JABÓ/BALDIM)



EMPRESA CONTRATADA

DHF CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA.



DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)

17/01/2025



VALOR GLOBAL DO CONTRATO

R\$ 463.024,62



DURAÇÃO DO PROJETO

09 MESES



VALOR EXECUTADO ATÉ JANEIRO/25

R\$ 0,00



NÚMERO DO CONTRATO

085/2024



PRÓXIMAS ETAPAS


Entrega Plano de Trabalho



FISCAL TÉCNICO APV
FERNANDA LAURINDA



PERCENTUAL
DE EXECUÇÃO



OBS: O Contrato 085/2024 abrange municípios de diferentes regiões fisiográficas da bacia: Baixo e Médio Alto Rio das Velhas



NO MÉDIO ALTO RIO DAS VELHAS

1. ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO COLETIVO PARA O MUNICÍPIO DE JABOTICATUBAS/MG – UTE JABÓ/BALDIM
2. ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO COLETIVO PARA O MUNICÍPIO DE JEQUITIBÁ/MG – UTE RIBEIRÃO JEQUITIBÁ
3. ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO COLETIVO PARA O MUNICÍPIO DE ESMERALDAS/MG – UTE RIBEIRÃO DA MATA
4. EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE PROPRIEDADES RURAIS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIBEIRÃO BONITO, EM CAETÉ (MG)

MÉDIO BAIXO RIO DAS VELHAS



EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA DE SOLUÇÕES INDIVIDUAIS DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DOMÉSTICOS, CONGONHAS DO NORTE/MG



LOCAL DE EXECUÇÃO
CONGONHAS DO NORTE (MG)
COMUNIDADE LAGOA
UTE RIO CIPÓ, UTE RIO PARAÚNA



DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)
13/09/2024



DURAÇÃO DO PROJETO
06 MESES



NÚMERO DO CONTRATO
052/2024



FISCAL TÉCNICA APV
FLÁVIA MENDES



EMPRESA CONTRATADA
APLICAR ENGENHARIA LTDA.



VALOR GLOBAL DO CONTRATO
R\$ 839.000,00



VALOR EXECUTADO ATÉ JANEIRO/25
R\$ 302.483,22



PRÓXIMAS ETAPAS
Execução de obras de soluções individuais de esgotamento sanitário

PERCENTUAL DE EXECUÇÃO



MÉDIO BAIXO RIO DAS VELHAS



IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE SOLUÇÕES INDIVIDUAIS DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DOMÉSTICOS, NA MICROBACIA DO CÓRREGO SOBERBO – UTE RIO CIPÓ, EM SANTANA DO RIACHO/MG



LOCAL DE EXECUÇÃO
SANTANA DO RIACHO/MG
UTE RIO CIPÓ



EMPRESA CONTRATADA
CONSTRUTORA JOAMAR LTDA.



DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)
Contrato assinado dia 13/01/2025



VALOR GLOBAL DO CONTRATO
R\$ 7.188.000,00



DURAÇÃO DO PROJETO
18 MESES



VALOR EXECUTADO ATÉ JANEIRO/25
R\$ 0,00



NÚMERO DO CONTRATO
087/2024



PRÓXIMAS ETAPAS
Execução de obras de soluções individuais de esgotamento sanitário



FISCAL TÉCNICA APV
FLÁVIA MENDES



PERCENTUAL DE EXECUÇÃO

0%



NO MÉDIO BAIXO RIO DAS VELHAS

1. ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO COLETIVO PARA O MUNICÍPIO DE INIMUTABA/MG – UTE SANTO ANTÔNIO/MAQUINÉ

BAIXO RIO DAS VELHAS



EXECUÇÃO DE PROJETOS DO PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO E PRODUÇÃO DE ÁGUA NO BAIXO VELHAS, VÁRZEA DA PALMA/MG



LOCAL DE EXECUÇÃO
VÁRZEA DA PALMA (MG)
MICROBACIA CÓRREGO PEDRAS GRANDES
UTE GUAICÚ



EMPRESA CONTRATADA
FORTAL ENGENHARIA LTDA.



DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)
23/07/2024



VALOR GLOBAL DO CONTRATO
R\$ 3.336.000,00



DURAÇÃO DO PROJETO
36 MESES



VALOR EXECUTADO ATÉ JANEIRO/25
R\$ 898.037,22



NÚMERO DO CONTRATO
036/2024




PRÓXIMAS ETAPAS
5º boletim de medição emitido
6º boletim de medição



FISCAL TÉCNICO APV
GUILHERME SILVA



**PERCENTUAL
DE EXECUÇÃO**



BAIXO RIO DAS VELHAS



EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA DE SOLUÇÕES INDIVIDUAIS DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DOMÉSTICOS, DIAMANTINA/MG



LOCAL DE EXECUÇÃO
DIAMANTINA (MG)
COMUNIDADE BATATAL
UTE RIO PARDO



EMPRESA CONTRATADA
APLICAR ENGENHARIA LTDA.



DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)
13/09/2024



VALOR GLOBAL DO CONTRATO
R\$ 2.087.619,80



DURAÇÃO DO PROJETO
08 MESES



VALOR EXECUTADO ATÉ JANEIRO/25
R\$ 331.361,63



NÚMERO DO CONTRATO
051/2024





PRÓXIMAS ETAPAS
Execução de obras de soluções individuais de esgotamento sanitário




FISCAL TÉCNICO APV
FLÁVIA MENDES



PERCENTUAL DE EXECUÇÃO

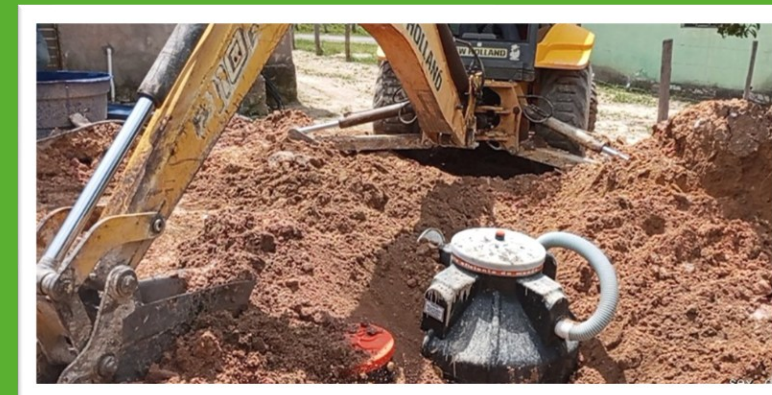

BAIXO RIO DAS VELHAS



ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO/EXECUTIVO PARA COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE ESGOTOS DOMÉSTICOS EM MÓDULOS INDIVIDUAIS EM LOCALIDADES RURAIS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS (LOTE 2)



LOCAL DE EXECUÇÃO

FUNILÂNDIA (MG) – TRONQUEIRAS (UTE RIBEIRÃO JEQUITIBÁ)
JEQUITIBÁ (MG) – DOUTOR CAMPOLINA (UTE RIBEIRÃO JEQUITIBÁ)
MORRO DA GARÇA (MG) – RIACHINHO (UTE RIO BICUDO)
BALDIM (MG) – JOÃO DA COSTA (UTE JABÓ/BALDIM)



EMPRESA CONTRATADA

DHF CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA.



DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)

17/01/2025



VALOR GLOBAL DO CONTRATO

R\$ 463.024,62



DURAÇÃO DO PROJETO

09 MESES



VALOR EXECUTADO ATÉ JANEIRO/25

R\$ 0,00



NÚMERO DO CONTRATO

085/2024



PRÓXIMAS ETAPAS

Entrega Plano de Trabalho



FISCAL TÉCNICO APV
FERNANDA LAURINDA



PERCENTUAL
DE EXECUÇÃO



OBS: O Contrato 085/2024 abrange municípios de diferentes regiões fisiográficas da bacia: Baixo e Médio Alto Rio das Velhas



EM BREVE

NO BAIXO RIO DAS VELHAS

EXPEDIENTE

CBH DO RIO DAS VELHAS

Poliana Aparecida Valgas de Carvalho
Presidenta

Ronald de Carvalho Guerra
Vice-presidente

Renato Junio Constâncio
Secretário

Heloisa Cristina França Cavaliéri
Secretário Adjunto

AGÊNCIA PEIXE VIVO

Gustavo Henrique Costa Simões
Presidente do Conselho de Administração

Rúbia Santos Barbosa Mansur
Diretora Geral

Berenice Coutinho Malheiros dos Santos
Gerente de Administração e Finanças

Jacqueline Evangelista Fonseca
Gerente de Projetos

Ohany Vasconcelos Ferreira
Gerente de Integração Interina

André Amaral Horta
Gerente de Gestão Estratégica

Daniel Alexandre de Brito
Analista de comunicação
Produção, projeto gráfico e revisão final

João Paulo Paulino Coimbra
Coordenador Técnico
Produção e revisão final



COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS

Rua Dos Carijós, 244 – Sala 622 – Centro,
Belo Horizonte (MG) - CEP 30.120-060
www.cbhvelhas.org.br | @cbhriodasvelhas

AGÊNCIA PEIXE VIVO

Rua dos Carijós, 166 – 5º andar – Centro,
Belo Horizonte (MG) - CEP 30.120-060
www.agenciapeixevivo.org.br | @agenciapeixevivo



COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS

Rua Dos Carijós, 244 – Sala 622 – Centro,
Belo Horizonte (MG) - CEP 30.120-060

www.cbhvelhas.org.br | [@cbhriodasvelhas](https://www.instagram.com/cbhriodasvelhas)

AGÊNCIA PEIXE VIVO

Rua dos Carijós, 166 – 5º andar – Centro,
Belo Horizonte (MG) - CEP 30.120-060

www.agenciapeixe vivo.org.br | [@agenciapeixe vivo](https://www.instagram.com/agenciapeixe vivo)
