

APÊNDICE I

RELATÓRIO DE AÇÕES REALIZADAS REFERENTES

AO PPA 2024-2027

CG 001/IGAM/2024 - CBH RIO PARÁ

EXERCÍCIO 2024

SUMÁRIO

EXECUÇÕES REFERENTES AO ANO DE 2024	3
Eixo I - Programas e Ações de Gestão	3
Eixo II – Programas e Ações de Planejamento	11
Eixo III - Programas e Ações Estruturais	15
CONCLUSÃO	19

EXECUÇÕES REFERENTES AO ANO DE 2024

A seguir serão apresentados os balanços e descritivos simplificados das ações realizadas ao longo do ano de 2024, a fim de permitir a melhor avaliação do cumprimento das metas relativas ao Indicador 3 (Gestão Finalística) do Contrato de Gestão 001/IGAM/2024.

O relatório é subdividido em tópicos de acordo com os Eixos de investimentos (Ações de Gestão, Ações de Planejamento e Ações Estruturais).

Cada empreendimento realizado possuirá uma ficha que, dentre outros, discrimina:

- i) O valor realizado em 2024;
- ii) O valor previsto em 2024;
- iii) O percentual físico realizado em 2024;
- iv) O percentual físico previsto para 2024;

Entende-se por empreendimento uma subatividade vinculada à determinada atividade do PPA 2024-2027 em que houve o emprego de esforço do corpo funcional da Agência Peixe Vivo na sua realização; podendo ou não ter havido desembolso financeiro referente à parcela de recursos de investimentos (92,5%) na sua execução parcial ou total.

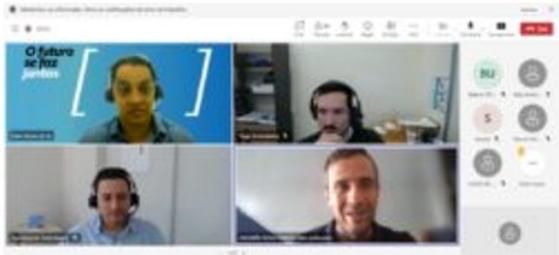
Eixo I - Programas e Ações de Gestão

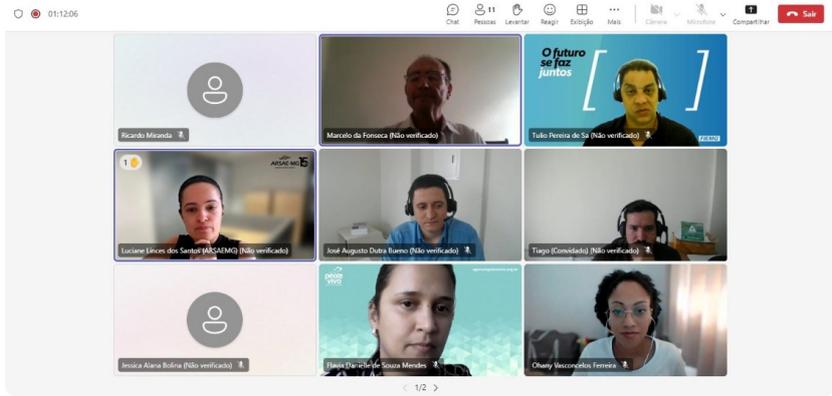
No ano de 2024, para o Eixo I – Programas e Ações de Gestão, estava previsto o desembolso de R\$ 1.011.500,00 e foram desembolsados R\$ 715.429,66, resultando em um saldo de R\$ 296.070,34 para o ano de 2025.

Estavam previstas a realização (parcial ou total) de 07 (sete) atividades em 2024 e todas foram realizadas, na totalidade ou parcialmente.

Empreendimentos (subatividades) executados em 2024

Ações de Gestão

Objeto: Serviços de apoio à realização de reuniões plenárias
Código PPA 2024-2027: I.1.1.1 - Apoio à Realização de Reuniões Plenárias Ordinárias / Extraordinárias
Nº do Contrato (se houver):
Data da assinatura da O.S (se houver):
Contratada (se for o caso):
Objetivo: Pagamento de diária de viagem e logística de viagem para conselheiros; locação de espaço e equipamentos para reuniões e aquisição de lanche para realização de reuniões plenárias.
Valor previsto em 2024: R\$ 4.500,00
Valor executado em 2024: R\$0,00
Percentual previsto para execução física até dez/2024: 100%
Percentual realizado de execução física até dez/2024: 100%
Principais dificuldades observadas em 2024 (se for o caso):
<p>Link de acesso para dados e informações complementares (se houver): Inicialmente, estava prevista a realização de pelo menos uma reunião plenária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Pará (CBH Rio Pará) de forma presencial. No entanto, durante a mobilização dos conselheiros para a reunião, percebeu-se a dificuldade em atingir o quórum necessário para o encontro presencial. Diante disso, decidiu-se realizar todas as reuniões do ano de forma virtual.</p>
<p>Fotos ou imagens alusivas (se houver):</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">  <p>Reunião 05/12/2024</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Reunião 02/07/2024</p> </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  <p>Reunião 14/03/2024</p> </div>

Objeto: Despesas gerais e logísticas para realização de reuniões de instâncias do CBH
Código PPA 2024-2027: I.1.1.2 - Apoio às atividades das Câmaras Técnicas e Grupos de Trabalho do Comitê do Rio Pará
Nº do Contrato (se houver):
Data da assinatura da O.S (se houver):
Contratada (se for o caso):
Objetivo: Pagamento de diária de viagem e logística de viagem para conselheiros participarem das reuniões das Câmaras Técnicas e Grupos de Trabalhos ou em reuniões para tratar de assuntos pertinentes às Câmaras Técnicas e Grupos de Trabalho; locação de espaço e equipamentos para reuniões e aquisição de lanche para realização de reuniões das Câmaras Técnicas e Grupos de Trabalho.
Valor previsto em 2024: R\$ 2.000,00
Valor executado em 2024: R\$ 674,10
Percentual previsto para execução física até dez/2024: 100%
Percentual realizado de execução física até dez/2024: 100%
Principais dificuldades observadas em 2024 (se for o caso):
Link de acesso para dados e informações complementares (se houver): As reuniões das Câmaras Técnicas e dos Grupos de Trabalho do CBH Rio Pará foram, em sua maioria, realizadas de forma virtual, o que resultou em um baixo desembolso nesta rubrica.
Fotos ou imagens alusivas (se houver):
 <p style="text-align: center;">Reunião CTC 30/10/2024</p>

Objeto: Serviços administrativos para pagamentos de adiantamentos, diárias, faturas logísticas, inscrições em eventos e outros para provimento da participação do Comitê em eventos designados
Código PPA 2024-2027: I.1.1.3 - Apoio à participação em eventos estaduais, nacionais e internacionais
Nº do Contrato (se houver): 020/2022
Data da assinatura da O.S (se houver): 20/05/2022
Contratada (se for o caso): Kepler Viagens, Eventos e Turismo
Objetivo: Agenciamento de viagens de membros e convidados do CBH do rio Pará
Valor previsto em 2024: R\$ 60.000,00 + remanejamento de R\$ 35.000,00
Valor executado em 2024: R\$ 88.072,86
Percentual previsto para execução física até dez/2024: 100%
Percentual realizado de execução física até dez/2024: 100%
Principais dificuldades observadas em 2024 (se for o caso): A rubrica inclui despesas com pagamento de diárias de viagens aos membros e convidados do CBH do rio Pará para participação em atividades do interesse do Comitê. Também inclui o contrato firmado com a empresa Kepler Viagens, Eventos e Turismo, responsável pelo agenciamento das viagens (compra de passagens, locação de carro etc.). O valor gasto superou o previsto para o ano, porém foi feito um remanejamento no valor de R\$ 35.000,00 para atender as demandas. É importante esclarecer que o planejamento leva em consideração principalmente o histórico de despesas dos anos anteriores. Deve-se considerar ainda, a grande oscilação dos preços das passagens aéreas e a participação de 2 representantes do Comitê no Fórum Mundial da Água, em Bali na Indonésia, quando inicialmente pensou-se na participação de apenas 1.
Link de acesso para dados e informações complementares (se houver):
Fotos ou imagens alusivas (se houver):

Representantes do CBH do Rio Pará no 10º Fórum Mundial da Água

Objeto: Apoio ou realização direta de 01 (um) evento aprovado pelo Comitê
Código PPA 2021-2023: I.1.1.4 - Apoio à realização de Audiências Públicas, Oficinas, Workshops, Seminários e ações de interesse do Comitê (Encontros, Festivais, Fóruns, Congressos e outros)
Nº do Contrato (se houver): 002/2021
Data da assinatura da O.S (se houver): 16/11/2021
Contratada (se for o caso): Tanto Design Ltda
Objetivo: O CBH do Rio Pará promoveu a Semana do Rio Pará 2024 “Educar para transformar”, no período de 06 a 10 de maio. Tratou-se de um importante passo para o fortalecimento do engajamento e mobilização da população da bacia hidrográfica. O Comitê também promoveu, com apoio da Tanto Expresso Comunicação e Mobilização Social uma oficina no dia 11 de setembro de 2024 em Divinópolis, com os objetivos: desenvolver as habilidades dos membros, como porta-vozes do CBH do Rio Pará; capacitar os porta-vozes do CBH do Rio Pará para que estejam aptos a transmitir mensagens ao seu público, à imprensa e aos cidadãos em geral, de forma clara e precisa, através de técnicas ministradas por especialistas; trabalhar postura e discurso, para usar a mídia a favor da instituição e de suas causas; introduzir <i>Storytelling</i> e oratória como estratégias; alinhar pontos fortes e fracos, dificuldades que tenham sido encontradas pelos porta-vozes na prática do contato com a imprensa e outros eventos e focar na postura, comunicação não verbal e construção do discurso.
Valor previsto em 2024: R\$ 45.000,00 – remanejamento de R\$35.000,00
Valor executado em 2024: R\$ 0,00
Percentual previsto para execução física até dez/2024: 100%
Percentual realizado de execução física até dez/2024: 100%
Principais dificuldades observadas em 2024 (se for o caso):
Link de acesso para dados e informações complementares (se houver): Os eventos foram realizados dentro do escopo do contrato previamente estabelecido com a empresa Tanto Design, responsável pelos serviços de comunicação para o CBH do Rio Pará. Assim, não foi necessário alocar recursos adicionais para a realização das atividades. Em razão disso, foi transferido o valor de R\$35.000,00 desta rubrica para outra, atendendo a demanda do comitê de bacia.
Fotos ou imagens alusivas (se houver):

Oficina de Comunicação realizada em Divinópolis, no dia 11/09/2024

Objeto: Contratação de empresa especializada em comunicação social e assessoria de imprensa para o Comitê
Código PPA 2024-2027: I.1.2.1 - Plano continuado de comunicação
Nº do Contrato (se houver): 02/2021
Data da assinatura da O.S (se houver): 08/11/2021
Contratada (se for o caso): Tanto Design Ltda.
Objetivo: Prestar serviços de apoio técnico na área de comunicação social e relacionamento; criação e produção editorial de publicações digitais e impressas; vídeos; comunicação online e ações de divulgação para o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Pará, com abrangência em todos os municípios da bacia.
Valor previsto em 2024: R\$ 600.000,00
Valor executado em 2024: R\$ 555.670,33
Percentual previsto para execução física até dez/2024: 100%
Percentual realizado de execução física até dez/2024: 100%
Principais dificuldades observadas em 2024 (se for o caso):
Link de acesso para dados e informações complementares (se houver): https://cbhriopara.org.br/ https://issuu.com/cbhriopara https://www.flickr.com/photos/194689772@N05/albums https://www.instagram.com/cbhriopara/ https://www.facebook.com/cbhriopara https://www.youtube.com/channel/UCZRdyFg3K9GkiUmZj8aSz9A
Fotos ou imagens alusivas (se houver):

Materiais produzidos

Objeto: Contratação de empresa especializada em confecção, editoração, diagramação e impressão e fornecimento de materiais de publicidade e promoção do Comitê.
Código PPA 2024-2027: I.1.2.2 - Divulgação das ações do CBH do Rio Pará
Nº do Contrato (se houver):
Data da assinatura da O.S (se houver): 076/2023 e 024/2024
Contratada (se for o caso): Super Brindes Ltda.
Objetivo: Aquisição de material institucional para Semana rio Pará 2024 (banner, folder e camisa) e aquisição de agenda CBH do rio Pará de 2024
Valor previsto em 2024: R\$ 100.000,00
Valor executado em 2024: R\$ 37.962,00
Percentual previsto para execução física até dez/2024: 100%
Percentual realizado de execução física até dez/2024: 100%
Principais dificuldades observadas em 2024 (se for o caso): O desembolso foi menor do que o previsto, pois em 2024 o CBH do rio Pará não contratou mídia para impulsionamento da Semana rio Pará.
Link de acesso para dados e informações complementares (se houver): Link para a matéria e vídeo da Semana Rio Pará 2024 – Educar para Transformar: https://cbhriopara.org.br/noticias/informacoes/novo-video-do-cbh-do-rio-para-apresenta-mostra-como-foi-a-semana-rio-para-2024-assista/
Fotos ou imagens alusivas (se houver):
 <p style="text-align: center;">Semana rio Pará</p>
 <p style="text-align: center;">Agenda CBH do rio Pará 2024</p>

Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada para elaboração e realização de capacitação técnica da ação estabelecida para plano de educação ambiental da bacia hidrográfica do Rio Pará
Código PPA 2024-2027: Implementação do plano continuado de educação ambiental
Código PIA 2024: I.1.2.3.1 - Contratação de consultoria especializada para atendimento de demandas de educação ambiental com poder público municipal
Nº do Contrato (se houver): 066/2024
Data da assinatura da O.S (se houver): 14/11/2024
Contratada (se for o caso): PLM ENGENHARIA LTDA. - CNJP 56.009.403/001-56
Objetivo do empreendimento: Trata-se de serviços de consultoria especializada para execução da ação de desenvolvimento sustentável definida no Programa de Educação Ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio Pará: “Capacitação para técnicos municipais em educação ambiental com foco em recursos hídricos”.
Valor previsto em 2024: R\$ 200.000,00
Valor executado em 2024: R\$ 33.050,37
Percentual previsto para execução física até dez/2024: 100%
Percentual realizado de execução física até dez/2024: 100%
Principais dificuldades observadas em 2024 (se for o caso): O CBH do Rio Pará vinha enfrentando dificuldades para formar as Câmaras Técnicas e os Grupos de Trabalho, o que ficava evidente pela participação dos mesmos conselheiros em diversas instâncias. Diante disso, o comitê decidiu criar uma única Câmara Técnica para tratar dos assuntos pertinentes, estabelecendo Grupos de Trabalho específicos apenas quando necessário. Esse processo levou tempo para ser concluído, e apenas no segundo semestre foi criado o Grupo de Trabalho de Educação Ambiental, com a primeira reunião ocorrendo em agosto de 2024. Como resultado, houve tempo suficiente para organizar apenas uma atividade educativa ao longo do ano.
Link de acesso para dados e informações complementares (se houver):
Fotos ou imagens alusivas (se houver):
 
<i>Capacitação técnica realizada com os membros do CBH Rio Pará</i>

Eixo II – Programas e Ações de Planejamento

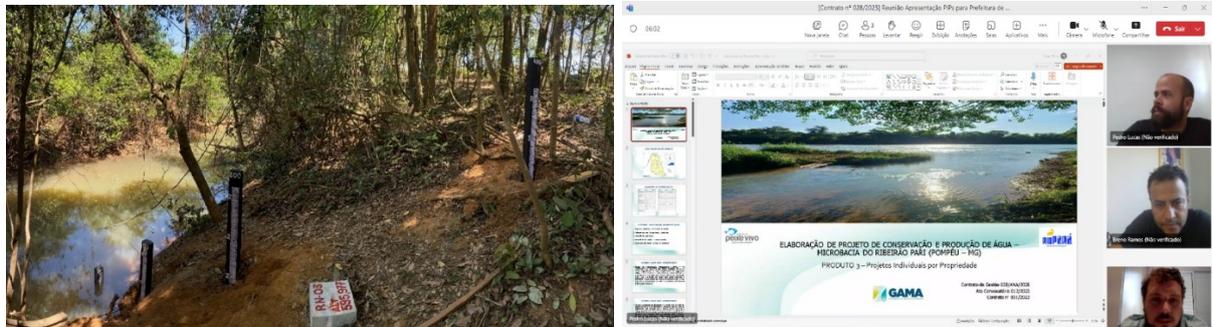
No ano de 2024, para o Eixo II – Programas e Ações de Planejamento, estava previsto o desembolso de R\$ 2.120.000; e foram desembolsados R\$ 695.286,45, resultando em um saldo de R\$ 1.424.713,55 para o ano de 2025.

Estavam previstas a realização (parcial ou total) de 03 (três) atividades em 2024, sendo todas realizadas. Dentre as 3 (três) atividades foram executadas 04 (quatro) subatividades no Eixo II, conforme demonstrado a seguir.

Empreendimentos (subatividades) executados em 2024 – Ações de Planejamento

Objeto: Elaboração de projetos de esgotamento sanitário individual em comunidades da zona rural da bacia do rio Pará
Código PPA 2024-2027: II.1.1.1 Elaboração e Gerenciamento de Projetos Básicos de Implantação, Ampliação e Melhoria de Sistemas de Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, Resíduos Sólidos e Drenagem Pluvial
Código PIA 2024: II.1.1.1.1 - Contratação de pessoa jurídica para elaboração de projetos básico/executivo para coleta, tratamento e destinação de esgotos domésticos em módulos individuais em localidades rurais, vinculadas ao programa de saneamento rural da bacia hidrográfica do rio Pará
Nº do Contrato (se houver): 035/2024
Data da assinatura da O.S (se houver): 29/07/2024
Contratada (se for o caso): CONSOMINAS ENGENHARIA LTDA
Objetivo do empreendimento: Ao longo dos anos, as diversas atividades econômicas desenvolvidas na bacia do rio Pará têm sido responsáveis por gerar inúmeros impactos no meio ambiente e, sobretudo, em seus recursos hídricos. O Programa de Saneamento Rural contemplará áreas com habitações unifamiliares, localidades e aglomerados rurais dos municípios do Alto, Médio e Baixo Pará, bem como, as comunidades isoladas que não são atendidas pela infraestrutura de tratamento de esgotos do sistema público local e que não estejam programadas para este atendimento no curto, médio e longo prazos, além de comunidades tradicionais (quilombolas, indígenas, etc.). O objetivo do projeto em questão é elaborar levantamento cadastral e desenvolver projetos para coleta, tratamento e disposição de efluentes domésticos em domicílios rurais nas localidades contempladas.
Valor previsto em 2024: R\$ 376.000,00
Valor executado em 2024: R\$ 151.772,55
Percentual previsto para execução física até dez/2024: 90%
Percentual realizado de execução física até dez/2024: 35%
Link de acesso para dados e informações complementares (se houver): https://cbhriopara.org.br/noticias/informacoes/programa-de-saneamento-rural-sequencia-avancando-e-cbh-do-rio-para-ira-beneficiar-350-familias/
Fotos ou imagens alusivas (se houver):


Objeto: Serviços de gerenciamento técnico, acompanhamento e fiscalização da implementação de programas de conservação ambiental na bacia hidrográfica do rio Pará
Código PPA 2024-2027: II.2.1.1 - Elaboração e Gerenciamento de Projetos para Controle de Erosão e Elaboração de Projetos Hidroambientais e Educação Ambiental
Código PIA 2024: II.2.1.1.1 - Serviços de gerenciamento técnico, acompanhamento e fiscalização da implementação de programas de conservação ambiental na bacia hidrográfica do rio Pará
N° do Contrato (se houver): 037/2023
Data da assinatura da O.S (se houver): 14/11/2023
Contratada (se for o caso): SANSAN Engenharia
<p>Objetivo do empreendimento: No ano de 2021, o CBH Rio Pará publicou o Manual do Programa de Conservação Ambiental e Produção de Água, na bacia hidrográfica do rio Pará que está disponível no link: https://cbhriopara.org.br/projetos/manuais/.</p> <p>As ações relacionadas ao Programa supracitado correspondem à conservação de estradas vicinais, gestão de microbacias, recuperação de pastagens, práticas conservacionistas de manejo de solo, dentre outras. Para a estimativa de custos da presente contratação foi considerada, inicialmente, i) a necessidade de detalhar localmente as ações específicas e, principalmente, ii) mapear as propriedades rurais que estão diretamente afetadas ao problema; iii) constituir uma comissão executiva e iv) dimensionar os recursos necessários para as intervenções pontuais, onde o processo erosivo se encontra avançado em diversos graus de intensidade.</p> <p>Dentro das fases de implementação do Programa de Conservação e Produção de Água nas microbacias, é chegado o momento de execução e acompanhamento da implementação, logo, torna-se imprescindível para a Agência Peixe Vivo realizar as contratações simultâneas de prestadores que realizarão a execução dos PIPs, em cada microbacia e também se torna imprescindível contratar uma gerenciadora para o Programa nestas duas microbacias. Sendo a justificativa para a contratação do objeto em questão, uma vez que, o acompanhamento ininterrupto é essencial para a continuidade do êxito obtido até o momento, desde o lançamento do Programa realizado pelo CBH Rio Pará em 2021.</p>
Valor previsto em 2024: R\$ 558.000,00
Valor executado em 2024: R\$ 387.784,62
Percentual previsto para execução física até dez/2024: 25%
Percentual realizado de execução física até dez/2024: 33,60%
<p>Principais dificuldades observadas em 2024 (se for o caso):</p> <p>Rescisão contratual em função inexecução das obrigações assumidas pela empresa contratada.</p>
Link de acesso para dados e informações complementares (se houver):
<p>Fotos ou imagens alusivas (se houver):</p> 

Objeto: Elaboração de projeto de conservação e produção de água - microbacia do ribeirão Pari (Pompéu - MG)
Código PPA 2024-2027: II.2.1.1 - Elaboração e Gerenciamento de Projetos para Controle de Erosão e Elaboração de Projetos Hidroambientais e Educação Ambiental
Código PIA 2024: II.2.1.1.2 - Elaboração de projeto de conservação e produção de água - microbacia do ribeirão Pari (Pompéu - MG)
Nº do Contrato (se houver): 023/2023
Data da assinatura da O.S (se houver): 11/09/2023
Contratada (se for o caso): GAMA Engenharia
<p>Objetivo do empreendimento:</p> <p>O objetivo da contratação, por meio da elaboração de diagnóstico e de projeto de conservação de água e solo na microbacia do ribeirão Pari (Pompéu - MG), é retratar a atual situação na microbacia em termos ambientais e socioeconômicos, bem como propor as ações mais pertinentes para sua adequação ambiental. Além disso, o trabalho servirá de subsídio à implantação de um Programa de Conservação e Produção de Água para a região e prevê o envolvimento com os atores da atividade agropecuária, a fim de atingir a sustentabilidade ambiental e socioeconômica da região.</p>
Valor previsto em 2024: R\$ 147.000
Valor executado em 2024: R\$ 154.640,59
Percentual previsto para execução física até dez/2024: 100%
Percentual realizado de execução física até dez/2024: 100%
Principais dificuldades observadas em 2024 (se for o caso):
<p>Link de acesso para dados e informações complementares (se houver):</p> <p>https://cbhriopara.org.br/projetos/programa-de-conservacao-ambiental-e-producao-de-agua/microbacia-do-ribeirao-pari-baixo-para/</p>
<p>Fotos ou imagens alusivas (se houver):</p> 

Objeto: Mapeamento da navegabilidade do rio Pará e de pontos notáveis dentro e fora da calha para apoio à divulgação das ações do comitê
Código PPA 2024-2027: II.3.1.1 - Diagnóstico da situação ambiental do rio Pará e afluentes para ampliação do conhecimento
Código PIA 2024: II.3.1.1.1 - Realização de mapeamento da navegabilidade do rio Pará e mapeamento de pontos notáveis dentro e fora da calha para apoio à divulgação das ações do Comitê
Nº do Contrato (se houver): 02/2025
Data da assinatura da O.S (se houver): 09/01/2025
Contratada (se for o caso): VLF SERVIÇOS LTDA.
<p>Objetivo do empreendimento:</p> <p>É crucial ter conhecimento dos trechos navegáveis e dos pontos notáveis dentro e fora da calha do Rio Pará para garantir trajetos seguros e eficientes durante expedições. Assim, o mapeamento do rio, utilizando levantamentos batimétricos, aerofotografias e o engajamento da comunidade ribeirinha, emerge como uma solução promissora para alcançar os objetivos do CBH Pará no planejamento e execução de expedições científicas.</p> <p>Ademais, a expedição é uma das iniciativas que complementa o trabalho de fortalecimento institucional do comitê, contribuindo para uma melhor divulgação do CBH do Rio Pará junto ao público da bacia hidrográfica. Isso permite disseminar as atividades do CBH e promover a interação entre as instituições da região.</p> <p>Nesse sentido, o objetivo da referida contratação é mapear o rio Pará, identificando os trechos navegáveis, bem como, as principais interferências à navegação e disponibilizar o resultado em aplicativo móvel de forma a planejar a realização das expedições.</p>
Valor previsto em 2024: R\$ 720.000,00
Valor executado em 2024: R\$ 1.088,69
Percentual previsto para execução física até dez/2024: 0%
Percentual realizado de execução física até dez/2024: 0%
<p>Principais dificuldades observadas em 2024 (se for o caso):</p> <p>Ausência de concorrentes no processo licitatório, acarretou licitação deserta e necessidade de nova publicação, o que atrasou o início dos serviços. O Contrato com a empresa vencedora foi assinado em janeiro/2025.</p>
<p>Link de acesso para dados e informações complementares (se houver):</p> <p>https://cbhriopara.org.br/noticias/informacoes/comite-vai-mapear-pontos-de-navegabilidade-e-qualidade-da-agua-do-rio-para-e-afluentes-da-bacia/</p>
<p>Fotos ou imagens alusivas (se houver):</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>

Eixo III - Programas e Ações Estruturais

No ano de 2024, para o Eixo III – Programas e Ações Estruturais, estava previsto o desembolso de R\$ 6.600.000,00 e foram desembolsados R\$ 4.040.572,72, resultando em um saldo de R\$ 2.559.427,28 para o ano de 2025.

Estavam previstas a realização (parcial ou total) de 02 (duas) atividades em 2024 e 1 (uma) foi realizada. Dentre as 2 (duas) atividades foram executadas 02 (duas) subatividades no Eixo III, conforme demonstrado a seguir.

Não foi possível iniciar a atividade III.1.1.1 referente a execução das intervenções em saneamento rural, pois houve atraso para a contratação da empresa para a elaboração dos projetos de soluções individuais de esgotamento sanitário. Os projetos foram contratados em 2024 e serão finalizados em 2025.

Objeto: Contratação de pessoa jurídica para a execução de serviços e obras vinculadas ao programa de conservação ambiental e produção de água na bacia hidrográfica do Ribeirão dos Custódios, no Município de Cláudio - Minas Gerais
Código PPA 2024-2027: III.2.1.1 - Execução de obras e serviços do Programa de Conservação e Produção de Água
Código PIA 2024: III.2.1.1.1 - Execução de projeto de conservação e produção de água - microbacia do ribeirão Custódio (Cláudio - MG)
Nº do Contrato (se houver): 04/2024
Data da assinatura da O.S (se houver): 16/02/2024
Contratada (se for o caso): FORTAL ENGENHARIA LTDA. - CNPJ nº 03.490.150/0001-19
Objetivo do empreendimento: Entre os anos de 2022 e 2023, foram elaborados projetos executivos individuais por propriedade - PIPs para a execução das ações de Conservação e Produção de Água na microbacia do Ribeirão dos Custódios, localizado no município de Cláudio – MG. Foram cadastradas as propriedades rurais na microbacia do Ribeirão dos Custódios, no município de Cláudio, que foram contempladas com a elaboração de projetos de adequação ambiental. Dentre as propriedades rurais cadastradas, foram identificadas inconformidades ambientais em 75 (setenta e cinco), sendo as mais diversas possíveis, desde solo descoberto (incluindo superpastoreio), até áreas de preservação permanente sem a presença de vegetação nativa e ocupadas por animais domésticos. Em outras situações, foi identificado o lançamento de efluentes de criação de animais diretamente em mananciais que são utilizados até mesmo para o consumo humano, o que além de grave inconformidade ambiental ocasiona sérios riscos à saúde humana. Diante das várias situações de inconformidades ambientais identificadas nas propriedades rurais cadastradas e diagnosticadas, foram elaborados projetos individuais por propriedade e, em seguida, estes mesmos proprietários foram comunicados e convidados a aderir voluntariamente à futura execução de ações de readequação ambiental das suas propriedades.

Este contrato visa à execução de ações planejadas no âmbito dos projetos individuais por propriedade elaborados e aceitos por seus proprietários, o que caracteriza o interesse maciço da população da microbacia em restabelecer as melhores condições ambientais para uso próprio e de toda a população da bacia hidrográfica do rio Pará.

Valor previsto em 2024: R\$ 5.000.000,00

Valor executado em 2024: R\$ 2.572.764,97

Percentual previsto para execução física até dez/2024: 65%

Percentual realizado de execução física até dez/2024: 35%

Principais dificuldades observadas em 2024 (se for o caso): desistência de alguns proprietários, especialmente em relação à disponibilização de áreas para plantio e cercamento.

Link de acesso para dados e informações complementares (se houver):

<https://cbhriopara.org.br/projetos/programa-de-conservacao-ambiental-e-producao-de-agua/microbacia-do-ribeirao-dos-custodios-alto-para/>

Fotos ou imagens alusivas (se houver):



Objeto: Contratação de pessoa jurídica para a execução de serviços e obras vinculadas ao programa de conservação ambiental e produção de água na bacia hidrográfica do Ribeirão do Sapé, no Município de Carmo do Cajuru - Minas Gerais
Código PPA 2024-2027: III.2.1.1 - Execução de obras e serviços do Programa de Conservação e Produção de Água
Código PIA 2024: III.2.1.1.2 - Execução de projeto de conservação e produção de água - microbacia do ribeirão Sapé (Carmo do Cajuru - MG)
Nº do Contrato (se houver): 05/2024
Data da assinatura da O.S (se houver): 19/02/2024
Contratada (se for o caso): EMBAÚBA AMBIENTAL LTDA. - CNPJ nº 07.571.528/0001-60
<p>Objetivo do empreendimento: Entre os anos de 2022 e 2023, foram elaborados os projetos executivos individuais por propriedade - PIPs para a execução das ações de Conservação e Produção de Água na microbacia do Ribeirão do Sapé, localizado no município de Carmo do Cajuru/MG.</p> <p>Foram cadastradas 73 (setenta e três) propriedades rurais na microbacia do Ribeirão do Sapé, que foram contempladas com a elaboração de projetos de adequação ambiental, dentro de Projetos Individuais por Propriedade (PIP). Dentre as propriedades rurais cadastradas, foram identificadas inconformidades ambientais, sendo as mais diversas possíveis, desde solo descoberto, até áreas de preservação permanente sem a presença de vegetação nativa e ocupadas por animais domésticos. Em outras situações, foi identificado o lançamento de efluentes de criação de animais diretamente em mananciais que são utilizados até mesmo para o consumo humano, o que além de grave inconformidade ambiental ocasiona sérios riscos à saúde humana.</p> <p>Diante das várias situações de inconformidades ambientais identificadas nas propriedades rurais cadastradas e diagnosticadas, foram elaborados projetos individuais por propriedade e, em seguida, estes mesmos proprietários foram comunicados e convidados a aderir voluntariamente à futura execução de ações de readequação ambiental das suas propriedades.</p> <p>Esta contratação visa a execução de ações planejadas no âmbito dos projetos individuais por propriedade elaborados e aceitos por seus proprietários, o que caracteriza o interesse maciço da população da microbacia em restabelecer as melhores condições ambientais para uso próprio e de toda a população da bacia hidrográfica do rio Pará.</p>
Valor previsto em 2024: R\$ 1.350.000,00
Valor executado em 2024: R\$ 1.467.275,46
Percentual previsto para execução física até dez/2024: 65%
Percentual realizado de execução física até dez/2024: 75%
Principais dificuldades observadas em 2024 (se for o caso):
<p>Link de acesso para dados e informações complementares (se houver): https://cbhriopara.org.br/projetos/programa-de-conservacao-ambiental-e-producao-de-agua/microbacia-do-ribeirao-do-sape-medio-para/</p>
<p>Fotos ou imagens alusivas (se houver):</p> 

Objeto: Contratação de pessoa jurídica para execução de serviços e obras vinculadas ao programa de conservação ambiental e produção de água na bacia hidrográfica do Ribeirão Pari (lote 1), no município de Pompéu - Minas Gerais
Código PPA 2024-2027: III.2.1.1 - Execução de obras e serviços do Programa de Conservação e Produção de Água
Código PIA 2024: III.2.1.1.3 - Execução de projeto de conservação e produção de água - microbacia do ribeirão Pari (Pompéu - MG)
Nº do Contrato (se houver): -
Data da assinatura da O.S (se houver): -
Contratada (se for o caso): -
<p>Objetivo do empreendimento: Entre os anos de 2023 e 2024, foram elaborados os projetos executivos individuais por propriedade - PIPs para a execução das ações de Conservação e Produção de Água na microbacia do Ribeirão Pari, localizado no município de Pompéu/MG. Foram cadastradas propriedades rurais na microbacia do Ribeirão Pari, que foram contempladas com a elaboração de projetos de adequação ambiental, dentro de Projetos Individuais por Propriedade (PIP). Dentre as propriedades rurais cadastradas, foram identificadas inconformidades ambientais, sendo as mais diversas possíveis, desde solo descoberto, até áreas de preservação permanente sem a presença de vegetação nativa e ocupadas por animais domésticos. Em outras situações, foi identificado o lançamento de efluentes de criação de animais diretamente em mananciais que são utilizados até mesmo para o consumo humano, o que além de grave inconformidade ambiental ocasiona sérios riscos à saúde humana.</p> <p>Diante das várias situações de inconformidades ambientais identificadas nas propriedades rurais cadastradas e diagnosticadas, foram elaborados projetos individuais por propriedade e, em seguida, estes mesmos proprietários foram comunicados e convidados a aderir voluntariamente à futura execução de ações de readequação ambiental das suas propriedades.</p> <p>Esta contratação visa a execução de ações planejadas no âmbito dos projetos individuais por propriedade elaborados e aceitos por seus proprietários, o que caracteriza o interesse maciço da população da microbacia em restabelecer as melhores condições ambientais para uso próprio e de toda a população da bacia hidrográfica do rio Pará.</p>
Valor previsto em 2024: R\$ 50.000,00
Valor executado em 2024: R\$ 0,00
Percentual previsto para execução física até dez/2024: 0,5%
Percentual realizado de execução física até dez/2024: 0%
Principais dificuldades observadas em 2024 (se for o caso): a execução dos projetos para as microbacias do Custódios (Cláudio) e Sapé (Carmo do Cajuru) ficaram mais caras que o inicialmente previsto e por isso os recursos previstos para a microbacia do Pari foram insuficientes. Com algumas frustrações observadas durante a execução do projeto em Cláudio, principalmente, será possível contratar parte das intervenções previstas para a microbacia do Ribeirão Pari, no ano de 2025.
Link de acesso para dados e informações complementares (se houver): https://cbhriopara.org.br/projetos/programa-de-conservacao-ambiental-e-producao-de-agua/microbacia-do-ribeirao-pari-baixo-para/
Fotos ou imagens alusivas (se houver):

CONCLUSÃO

Conforme demonstrado neste Apêndice, os indicadores previstos no Programa de Trabalho do Contrato de Gestão Nº 001/IGAM/2024, firmado entre IGAM e Agência Peixe Vivo, foram atendidos, em cumprimento às obrigações assumidas no âmbito do CBH Rio Pará.
